



BÁO CÁO THÁNG 8/2024 & KẾ HOẠCH THÁNG 9/2024

Dự Án: Chung cư khu vườn trên mây A&T (A&T SKY GARDEN)

Số/ No.: A&T/CDC/09

Thời gian thi công: Ca 1: 07:30 - 17:30

Thời gian báo cáo từ : 01/08/2024 to 31/08/2024

Ca 2: 17:00 - 7:30

1. THỜI TIẾT CÁC NGÀY TRONG THÁNG (PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM)

2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRONG THÁNG

- Tổng hợp nhân lực và thiết bị công trường trong tháng

STT	Nhân lực	Số lượng	Kế hoạch tháng sau	Ghi chú
1	Giám đốc dự án	1	1	
2	Chỉ huy trưởng	1	1	
3	Chỉ huy phó	2	2	
4	Cán bộ kỹ thuật	6	6	
5	Nhân Viên An toàn	3	3	
6	Kế toán	1	1	
7	QA/QC	2	3	
8	QS	1	2	
9	Kỹ sư Shop drawing	1	2	
10	Kỹ sư trắc đạc	3	3	
11	Nhân viên thủ kho	1	1	
12	Thợ điện	1	1	
13	An ninh	2	2	
14	Nhân lực thầu phụ Toàn Phước Huy	16	11	Đào & vận chuyển đất
15	Nhân lực thầu phụ Phúc Tiến	5	7	Cầu tháp
16	Nhân lực thầu phụ Hirose	8	4	Tháo dỡ văng chống
17	Nhân lực thầu phụ Việt Đức	8	4	Tháo dỡ văng chống
18	Tổ thi công ván khuôn	15	20	Móng và sàn hầm
19	Tổ thi công cốt thép	15	20	Móng và sàn hầm
20	Tổ thi công bê tông	15	20	Móng và sàn hầm
21	Tổ tiện ren	2	2	Móng và sàn hầm
Tổng số nhân lực		109	116	

STT	Thiết bị	Số lượng	Kế hoạch tháng sau	Ghi chú
1	Máy đục đầu cọc	2	3	
2	Cầu tháp	2	2	
3	Máy gia công thép	2	3	
4	Máy tiện ren	1	2	
5	Máy thủy bình	2	2	
6	Máy toàn đạc	2	2	
Tổng số		11	14	

2.1 Vật tư chính nhập vào công trường trong tháng

STT	Tên vật tư/Thiết bị	Tổng Khối lượng dự kiến	ĐVT	KL Nhập	Lũy kế	% Hoàn thành
1	Thép thi công móng, cột vách và sàn hầm B2	762	tấn	629	887	116%
2	Bột chống thấm tinh thể thấm thấu GPS Cro15	572	bao	306	506	88%
3	Chống thấm bittum GPS Membrane	139	thùng	100	100	72%

2.2 Các cuộc họp, công văn đi, công văn đến

2.2.1 Các cuộc họp trong tháng

Họp ngày từ thứ 2 đến thứ 7

Họp tuần (thứ 6 hàng tuần)

2.2.2 Công văn đi

2.2.3 Công văn đến

2.2.4 Các vấn đề tồn đọng

3. CÔNG TÁC HỒ SƠ**3.1. Hồ sơ đệ trình****3.1.1 Hồ sơ đã đệ trình tính đến ngày 31/08/2024****ĐỆ TRÌNH TRONG THÁNG**

Mã hiệu	Mô Tả	Số trình duyệt	Ngày duyệt	Ghi chú
* Hồ sơ chất lượng	File đính kèm			
* Bản vẽ	File đính kèm			
* Khối lượng				

3.1.2 Hồ sơ sẽ đệ trình trong tháng tới**HỒ SƠ TRÌNH DUYỆT THÁNG KẾ TIẾP****ĐỆ TRÌNH THÁNG KẾ TIẾP**

Mã hiệu	Mô Tả	Số trình duyệt	Ngày trình dự kiến	Ghi chú
* Hồ sơ chất lượng				
* Bản vẽ				
AT-SKG/04	Bản vẽ shop thép sàn tầng 1		05/09 ÷ 10/09	
AT-SKG/04	Bản vẽ shop thép dầm tầng 1		31/08 ÷ 07/09	
AT-SKG/04	Bản vẽ shop cột vách từ tầng 1 đến tầng 6		07/09 ÷ 12/09	
AT-SKG/04	Bản vẽ shop thép sàn tầng 2		15/09 ÷ 22/09	
AT-SKG/04	Bản vẽ shop thép dầm tầng 2		10/09 ÷ 15/09	
AT-SKG/04	Bản vẽ shop thép dầm tầng 3		25/09 ÷ 30/09	
AT-SKG/04	BPTC bể sinh hoạt hầm B2		31/08 ÷ 07/09	
AT-SKG/04	BPTC thi công tổng thể và chi tiết phần thân		17/09 ÷ 26/09	
* Khối lượng				
	Hồ sơ thanh toán đợt 7		05/09 ÷ 10/09	

4. NGHIỆM THU**4.1 Công tác nghiệm thu trong tháng**

STT	Nghiệm thu vật liệu trong tháng	Số lượng	Đơn vị	Ngày nghiệm thu	Đạt/Không	Ghi chú
1	Bột tinh thể thẩm thấu chống thấm GPS Cro15	306	bao	01/08/2024 - 31/08/2024	Đạt yêu cầu	
2	Thép	629	tấn	01/08/2024 - 31/08/2024	Đạt yêu cầu	
3	Chống thấm bittum GPS Membrane	100	thùng	01/08/2024 - 31/08/2024	Đạt yêu cầu	
STT	Công việc xây dựng trong tháng	Thời gian nghiệm thu		Đạt/không đạt	Ghi chú	
I	Thi công cột vách hầm B2					
1	Nghiệm thu GCLD cốt thép + ván khuôn cột vách hầm B2	16/08/2024 ÷ 31/08/2024		Đạt yêu cầu		
II	Thi công móng					
2	Nghiệm thu GCLD ván khuôn + cốt thép móng	01/08/2024 ÷ 22/08/2024		Đạt yêu cầu		
III	Thi công sàn hầm B2					
1	Nghiệm thu GCLD ván khuôn + cốt thép sàn hầm B2 đợt 2	06/08/2024		Đạt yêu cầu		
2	Nghiệm thu GCLD ván khuôn + cốt thép sàn hầm B2 đợt 4	14/08/2024		Đạt yêu cầu		
3	Nghiệm thu GCLD ván khuôn + cốt thép sàn hầm B2 đợt 5	26/08/2024		Đạt yêu cầu		
4	Nghiệm thu GCLD ván khuôn + cốt thép sàn hầm B2 đợt 3+6	28/08/2024		Đạt yêu cầu		
5	Nghiệm thu GCLD ván khuôn + cốt thép sàn hầm B2 đợt 7	30/08/2024		Đạt yêu cầu		

5. TIẾN ĐỘ THI CÔNG TRONG THÁNG

STT	Hạng mục	Tổng KL	Kế hoạch tháng	Thực tế	Lũy kế đã thực hiện	Nguyên nhân & kế hoạch lấy lại tiến độ	Ghi chú
1	Thi công đào đất (m3)	49000		3056	53530	Hoàn thành hạng mục đào đất tại dự án	
2	Tháo dỡ văng chống lớp 2 zone 1, 2, 3, 4	305	305	305	305	Hoàn thành tháo dỡ 100% văng chống lớp 2	
3	Đổ bê tông móng zone 1,2,3,4 (m3)	5472,26	2832,28	2486,16	5472,26	Hoàn thành 100% hạng mục móng	

4	Đổ bê tông sàn hầm B2 (m3)	2749,42	2513,5	2487,42	2749,42	Hoàn thành 100% hạng mục sàn hầm B2
5	Đổ bê tông cột vách hầm B2 (m3)	283,5	182,31	200,6	283,5	Đạt 110% kế hoạch tháng, hoàn thành 70,8% tổng khối lượng
6	Đổ bê tông sàn hầm B1 đợt 1 (m3)	295		295	295	Hoàn thành 100% khối lượng

6. KẾ HOẠCH VẬT TƯ & THI CÔNG THÁNG SAU

6.1 Kế hoạch vật tư

STT	Nội dung	Ngày dự kiến	Khối lượng	Đơn vị	Ghi chú
1	Thép	10/09/2024 ÷ 30/09/2024	500	Tấn	
1	Chống thấm bittum GPS Membrane	10/09/2024 ÷ 30/09/2024	39	thùng	


6.2. Kế hoạch thi công

No.	Hạng mục thi công	Đơn vị	Tổng KL dự kiến	Kế hoạch dự kiến tháng này	Lũy kế dự kiến	Ghi chú
I	Tháo dỡ văng chống					
1	Văng chống Zone 1 lớp 1	tấn	110	110	110	
2	Văng chống Zone 2 lớp 1	tấn	77	77	77	
3	Văng chống Zone 3 lớp 1	tấn	72	72	72	
4	Văng chống Zone 4 lớp 1	tấn	90	90	90	
II	Thi công sàn hầm B1					
1	Đổ bê tông sàn hầm B1 đợt 2	m3	316,00	316,00	316,00	
2	Đổ bê tông sàn hầm B1 đợt 3	m3	501,30	501,30	501,30	
3	Đổ bê tông sàn hầm B1 đợt 4	m3	266,00	266,00	266,00	
4	Đổ bê tông sàn hầm B1 đợt 5	m3	267,00	267,00	267,00	
III	Thi công cột vách hầm B2					
1	Đổ bê tông cột vách hầm B2	m3	283,50	82,90	283,50	
III	Thi công cột vách hầm B1					
1	Đổ bê tông cột vách hầm B1	m3	127,24	127,24	127,24	
IV	Thi công sàn cos 0,00					
1	Đổ bê tông sàn hầm cos 0,00 đợt 1	m3	368,70	368,70	127,24	
2	Đổ bê tông sàn hầm cos 0,00 đợt 2	m3	585,00	585,00	585,00	

7. TÌNH HÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

- Tổ chức các cuộc họp an toàn hàng ngày trước khi làm việc
- Huấn luyện an toàn cho nhân viên mới trước khi bắt đầu công việc
- Thu gom rác thải định kỳ
- Kiểm tra an toàn thiết bị, máy móc trước khi thi công
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc
- Thu gom chất thải

8. Hình ảnh thi công trong tháng

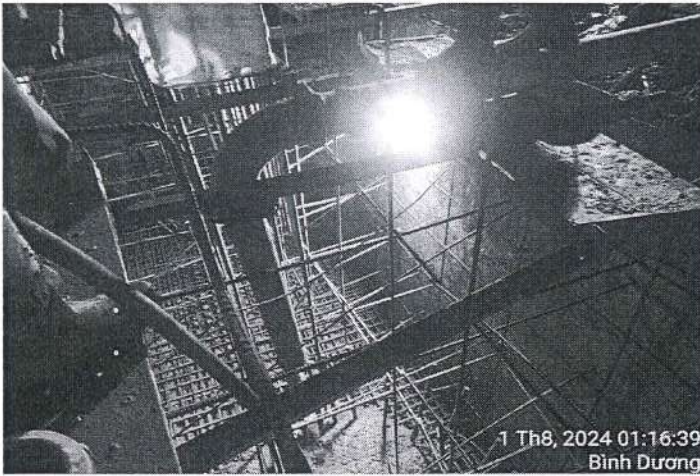

Đổ bê tông móng M2




Tươi sika trước khi đổ bê tông móng M2D



Nghiệm thu cao độ đất trước khi đổ bê tông lót sàn hầm B2



Kiểm tra khoan cấy thép dầm DCT5G

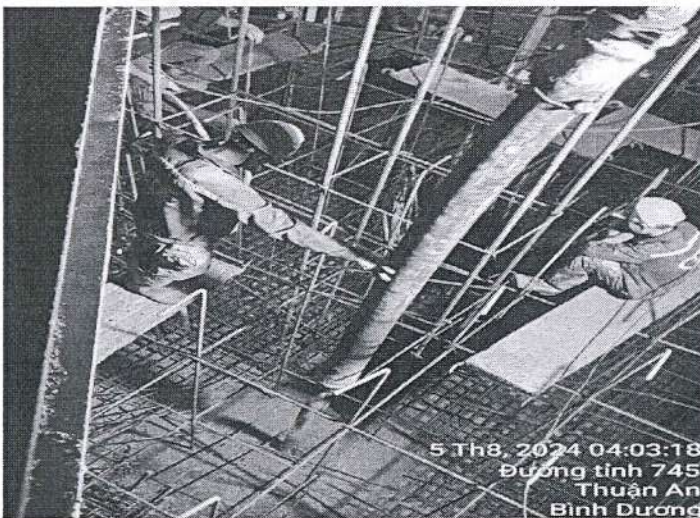

Đổ bê tông móng M3F




Đổ bê tông sàn hầm B2 đợt 2



GCLD ván khuôn + cốt thép móng MTM1




Nhập ván khuôn nhôm về dự án

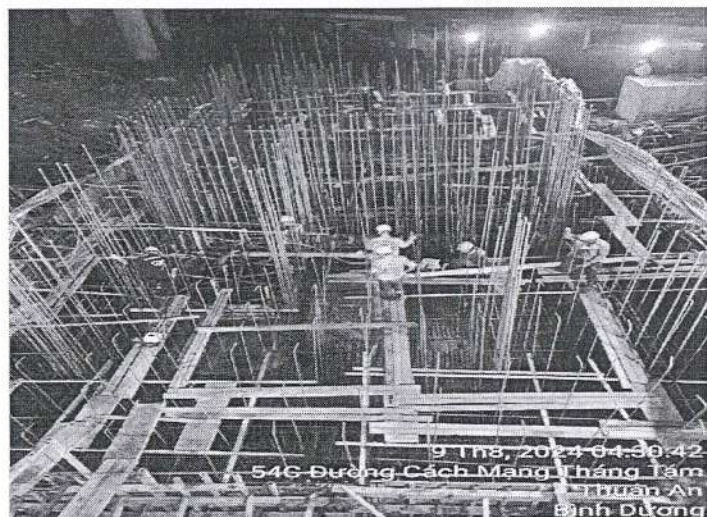

Đổ bê tông móng MTM1 (đợt 1)




Kiểm tra thép nhập về dự án

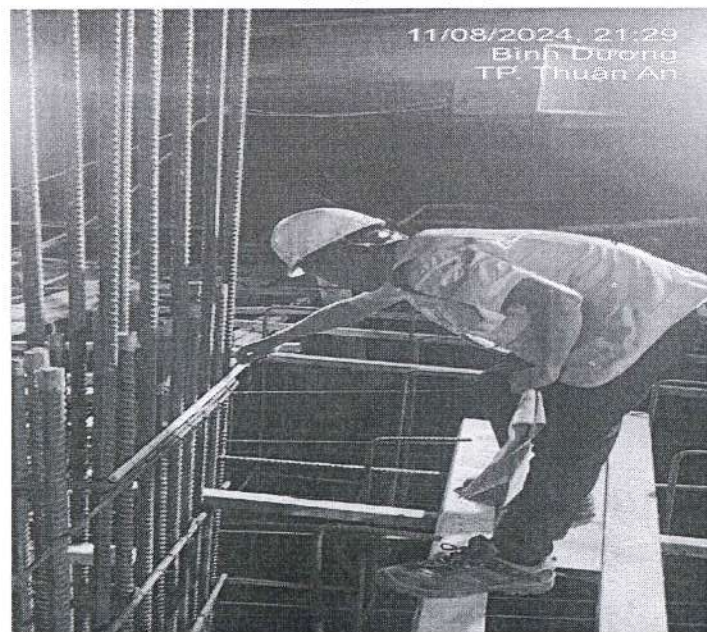

Nghiệm thu ván khuôn + cốt thép móng M6



Đổ bê tông móng MTM1 (đợt 2)

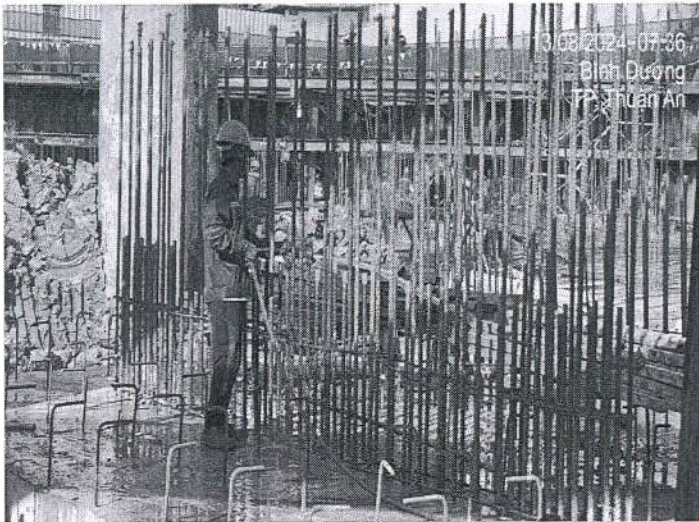

13/08/2024 07:36
Bình Dương
TP. Thuận An

Bảo dưỡng bê tông móng M6



14 thg 8, 2024 08:07:35
Thuận An
Bình Dương

Rắc bột tinh thể thấm thấu chống thấm sàn hầm B2



15/08/2024 09:36
13 Đường Cách Mạng Tháng 8
Bình Dương
TP. Thuận An

Nghiệm thu ty ren và siết lực coupler vách thang máy VTM1-A



16 Th8, 2024 15:59:57
54C Đường Cách Mạng Tháng Tám
Thuận An
Bình Dương

Nghiệm thu ván khuôn + cốt thép móng M2



17/8/24 16:58
Bình Dương

Kiểm tra xử lý ty móng M2



18 Th8, 2024 09:43:39
Thuận An
Bình Dương

Nghiệm thu cốt thép vách thang máy, vách tường vẩy và cột C2+C4+C2B



Nghiệm thu cốt thép vách V1H, V22



Nghiệm thu cốt thép vách V19, V16



Tươi sika trước khi đổ bê tông vách thang máy VTM1



Nghiệm thu cốt thép vách V16, V18, V19, V21B, cột CDD (3 cột)



Rắc bột tinh thể chống thấm hồ bơm 02 và hồ thang T05



Nghiệm thu ván khuôn vách V21



25 Th8, 2024 19:25:30
54C Đường Cách Mạng Tháng Tám
Thuận An
Bình Dương

Tươi sika trước khi đổ bê tông vách tường vây hầm B2



26 Th8, 2024 19:42:02
168 Đường Cách Mạng Tháng Tám
Thuận An
Bình Dương

Nghiệm thu ván khuôn + cốt thép sàn hầm B2 đợt 5




27/08/2024, 04:23
54C Đường Cách Mạng Tháng 8
Bình Dương
TP. Thuận An

Đổ bê tông sàn hầm B2 đợt 5




28 Th8, 2024 03:14:42
54C Đường Cách Mạng Tháng Tám
Thuận An
Bình Dương

Rắc bột tinh thể chống thấm sàn hầm B2 đợt 3+6

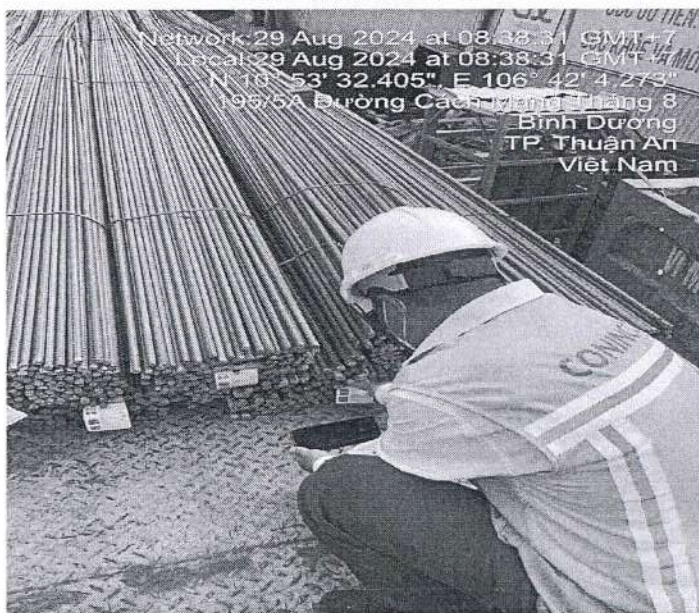


Network 29 Aug 2024 at 08:38:31 GMT+7
Local 29 Aug 2024 at 08:38:31 GMT+7
N: 10° 53' 32.405", E: 106° 42' 4.273"
195/5A Đường Cách Mạng Tháng 8
Bình Dương
TP. Thuận An
Việt Nam

Kiểm tra thép nhập về dự án

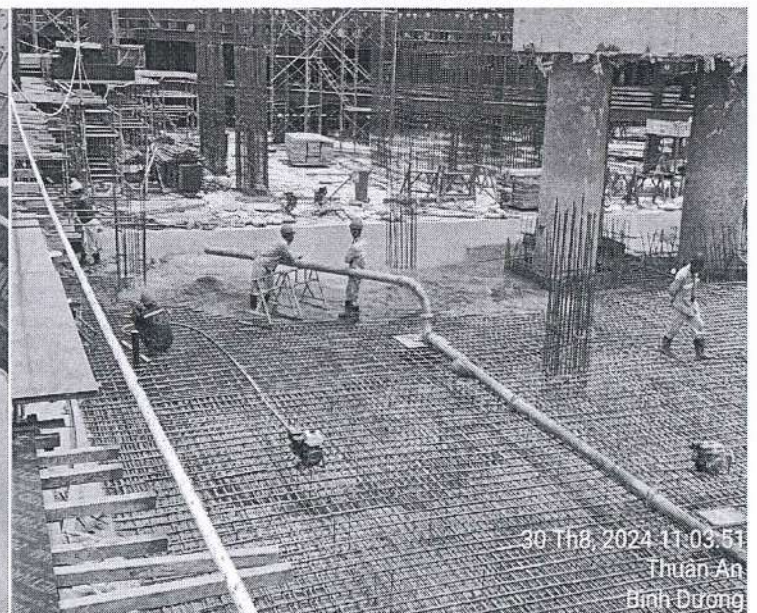

30 Th8, 2024 11:03:51
Thuận An
Bình Dương

Đổ bê tông sàn hầm B2 đợt 7

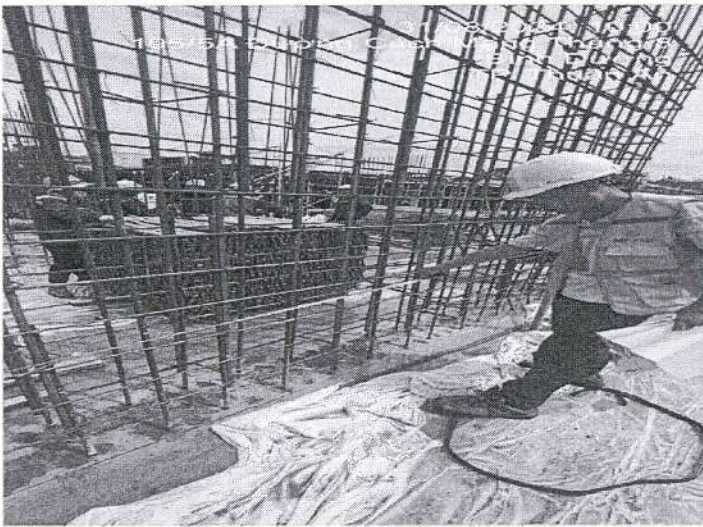

Nghiệm thu cốt thép vách hầm B2



Nghiệm thu quét chống thấm vách tường hầm

Nơi nhận:

- BQL DA:
- TVGS:
- Lưu: BCH CT (để tổng hợp)

Giám đốc dự án


Trần Đình Mạnh

Chỉ huy phó


Đinh Văn Linh

Người lập


Nguyễn Minh Chí

PHỤ LỤC THỜI TIẾT

Ngày 01/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 02/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 03/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 04/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 05/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 06/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 07/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 08/08/2024 Từ 0h-12h	
Từ 12h-24h		Từ 12h-24h		Từ 12h-24h		Từ 12h-24h		Từ 12h-24h		Từ 12h-24h		Từ 12h-24h		Từ 12h-24h	
Ngày 09/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 10/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 11/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 12/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 13/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 14/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 15/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 16/08/2024 Từ 0h-12h	
Từ 12h-24h		Từ 12h-24h		Từ 12h-24h		Từ 12h-24h		Từ 12h-24h		Từ 12h-24h		Từ 12h-24h		Từ 12h-24h	
Ngày 17/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 18/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 19/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 20/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 21/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 22/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 23/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 24/08/2024 Từ 0h-12h	
Từ 12h-24h		Từ 12h-24h		Từ 12h-24h		Từ 12h-24h		Từ 12h-24h		Từ 12h-24h		Từ 12h-24h		Từ 12h-24h	
Ngày 25/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 26/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 27/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 28/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 29/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 30/08/2024 Từ 0h-12h		Ngày 31/08/2024 Từ 0h-12h		Từ 12h-24h	
Từ 12h-24h		Từ 12h-24h		Từ 12h-24h		Từ 12h-24h		Từ 12h-24h		Từ 12h-24h		Từ 12h-24h		Từ 12h-24h	

- Bình thường
- Mưa phùn
- Mưa không thi công được
- Nắng không thi công được
- Mát điện

BẢN VẼ SHOPDRAWING

DỰ ÁN:
**CHUNG CƯ KHU VƯỜN TRÊN MÂY
A & T(A & T SKY GARDEN)**

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG :SỐ 54C, KHU PHỐ HÒA LONG PHƯƠNG LÃI
THIỆU, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ ĐẦU TƯ:
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN ĐÔ THỊ A & T BÌNH DƯƠNG**



ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG :SỐ 54C, KHU PHỐ HÒA LONG PHƯƠNG LÃI
THIỆU, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

TƯ VẤN GIÁM SÁT
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,
THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG- CONINCO**



ĐỊA CHỈ: SỐ 4 PHỐ TÔN THẤT TÙNG, PHƯỜNG TRUNG TỰ, QUẬN ĐÔNG
ĐÀ, TP HÀ NỘI

GIÁM SÁT TRƯỞNG:	
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG	
NGƯỜI KIỂM TRA	
NGUYỄN TRƯƠNG THẮNG	

NHÀ THẦU THI CÔNG :
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC



ĐC: LK18-24, GALAXY 8, KHU NHÀ Ở NGÂN HÀ VẠN PHÚC, 69 TÔ HỮU -
VẠN PHÚC - HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI

CHỈ HUY TRƯỞNG:	
NGUYỄN QUANG LÂM	
NGƯỜI THỰC HIỆN	
NGUYỄN TRẦN THUẬN PHÁT	

GÓI THẦU:	TÔNG THẦU THI CÔNG
HẠNG MỤC:	BIỆN PHÁP THI CÔNG
TÊN BẢN VẼ:	MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT VÁCH HẦM B2
SỐ HIỆU BV:	A&T/CDC/JKC/BVBTCC-CV-02
NGÀY LẬP BV:	17/08/2024
BV THAM CHIẾU	
CHỈNH SỬA:	REV02



Đã thi công
Kế hoạch thi công
tháng 9/2024

MẶT BẰNG KẾ HOẠCH THI CÔNG CỘT VÁCH HẦM B2 (COS -6.600) THÁNG 9/2024

BẢN VẼ SHOPDRAWING

DỰ ÁN:
**CHUNG CƯ KHU VƯỜN TRÊN MÂY
A & T(A & T SKY GARDEN)**
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG :SỐ 54C, KHU PHỐ HÒA LONG PHƯỜNG LÁI
THIỆU, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ ĐẦU TƯ:
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN ĐÔ THỊ A & T BÌNH DƯƠNG**

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG :SỐ 54C, KHU PHỐ HÒA LONG PHƯỜNG LÁI
THIỆU, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

TƯ VẤN GIÁM SÁT
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,
THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG- CONINCO**



ĐỊA CHỈ: SỐ 4 PHỐ TÔN THẤT TÙNG, PHƯỜNG TRUNG TỰ, QUẬN ĐÔNG
ĐÀ, TP HÀ NỘI

GIÁM SÁT TRƯỞNG:
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
NGƯỜI KIỂM TRA
NGUYỄN TRƯƠNG THẮNG


NHÀ THẦU THI CÔNG:
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC



ĐC: LK18-24, GALAXY 8, KHU NHÀ Ở NGÃN HÀ VẠN PHÚC, 89 TÔ HỮU -
VẠN PHÚC - HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI
TEL: 0243 9430 888
CHỈ HUY TRƯỞNG:

CHỈ HUY TRƯỞNG:
NGUYỄN QUANG LÂM
NGƯỜI THỰC HIỆN
NGUYỄN TRẦN THUẬN
PHÁT

GÓI THẦU:	TỔNG THẦU THI CÔNG
HẠNG MỤC:	BIỆN PHÁP THI CÔNG
TÊN BẢN VẼ:	MẶT BẰNG BỐ TRÍ MẠCH NGỦNG SÀN HẦM B2
SỐ HIỆU BV:	A&T/CDC/KC/BVBP/C/MN-02
NGÀY LẬP BV:	27/07/2024
BV THAM CHIẾU	
CHỈNH SỬA:	REV03

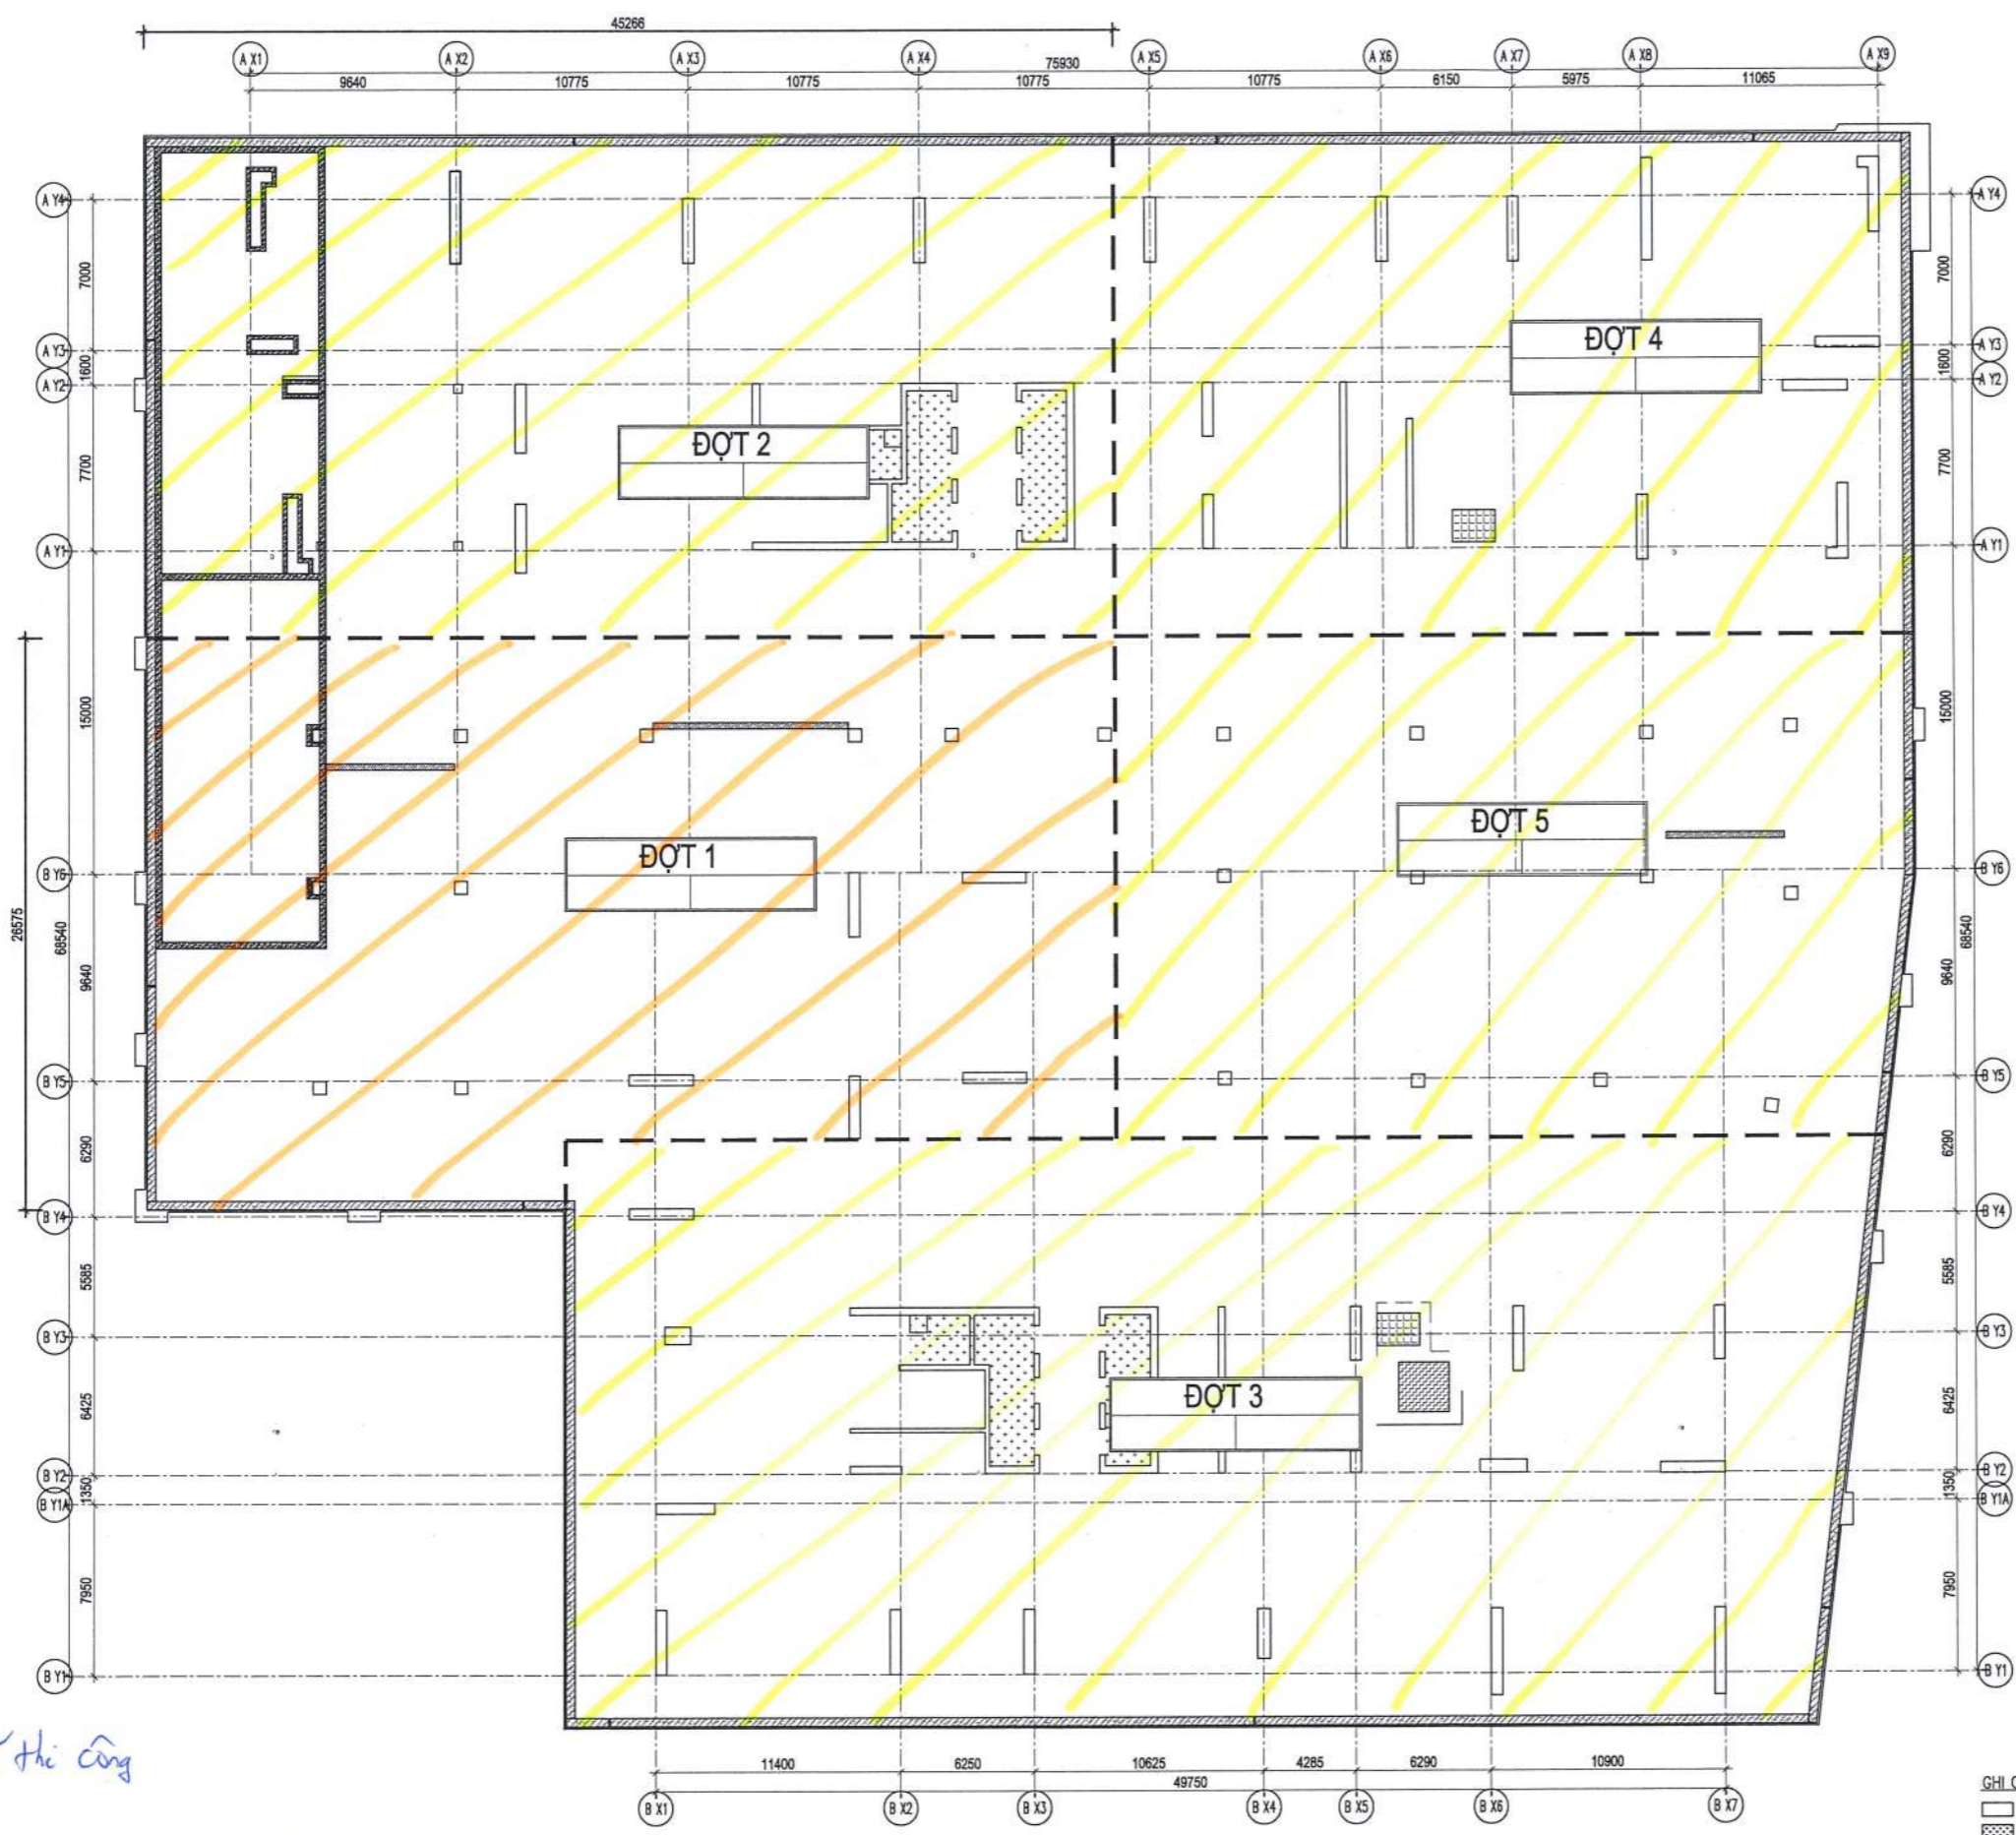

Đã thi công
Kế hoạch thi công tháng 9/2024

MẶT BẰNG KẾ HOẠCH THI CÔNG SÀN HẦM B1 THÁNG 9/2024

- GHỊ CHÚ:**
- SÀN DÀY 500 (CỐT -8.60)
 - SÀN HỖ PÍT DÀY 1500 HẠ CỐT 3000 (CỐT -9.60)
 - SÀN HỖ BOM DÀY 500 HẠ CỐT 2050 (CỐT -8.65)
 - RÀNH NƯỚC
 - VÁCH BỂ NƯỚC SINH HOẠT
 - HỖ PÍT THANG MÁY DÀY 500 HẠ CỐT 1500 (CỐT -8.10)
 - LỖ MỎ, LỖ KT
 - SÀN GA THU NƯỚC DÀY 500 HẠ CỐT THEO

BẢN VẼ SHOPDRAWING

DỰ ÁN:
**CHUNG CƯ KHU VƯỜN TRÊN MÂY
 A & T(A & T SKY GARDEN)**
 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG :SỐ 54C, KHU PHỐ HÒA LONG PHƯỜNG LÃI
 THIÊU, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ ĐẦU TƯ:
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT
 TRIỂN ĐÔ THỊ A & T BÌNH DƯƠNG**



Địa điểm xây dựng :SỐ 54C, KHU PHỐ HÒA LONG PHƯỜNG LÃI
 THIÊU, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

TƯ VẤN GIÁM SÁT
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,
 THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG- CONINCO**



Địa chỉ: SỐ 4 PHỐ TÔN THẤT TÙNG, PHƯỜNG TRUNG TỰ, QUẬN ĐÔNG
 ĐÀ, TP HÀ NỘI

GIÁM SÁT TRƯỞNG:
 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
 NGƯỜI KIỂM TRA
 NGUYỄN TRƯƠNG THẮNG


NHÀ THẦU THI CÔNG:
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC



ĐC: LK18-24, GALAXY 8, KHU NHÀ Ở NGÃN HÀ VẠN PHÚC, 89 TÔ HỮU
 VẠN PHÚC - HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI
 TEL: 0243 9430 888
 CHỈ HUY TRƯỞNG:

CHỈ HUY TRƯỞNG:
 NGUYỄN QUANG LÂM
 NGƯỜI THỰC HIỆN
 NGUYỄN TRẦN THUẬN
 PHÁT

GÓI THẦU:	TỔNG THẦU THI CÔNG
HẠNG MỤC:	BIỆN PHÁP THI CÔNG
TÊN BẢN VẼ:	MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT VÁCH HẦM B1
SỐ HIỆU BV:	A&T/CDC/KC/BVBP/TC-CV-03
NGÀY LẬP BV:	17/08/2024
BV THAM CHIẾU	
CHỈNH SỬA:	REV02

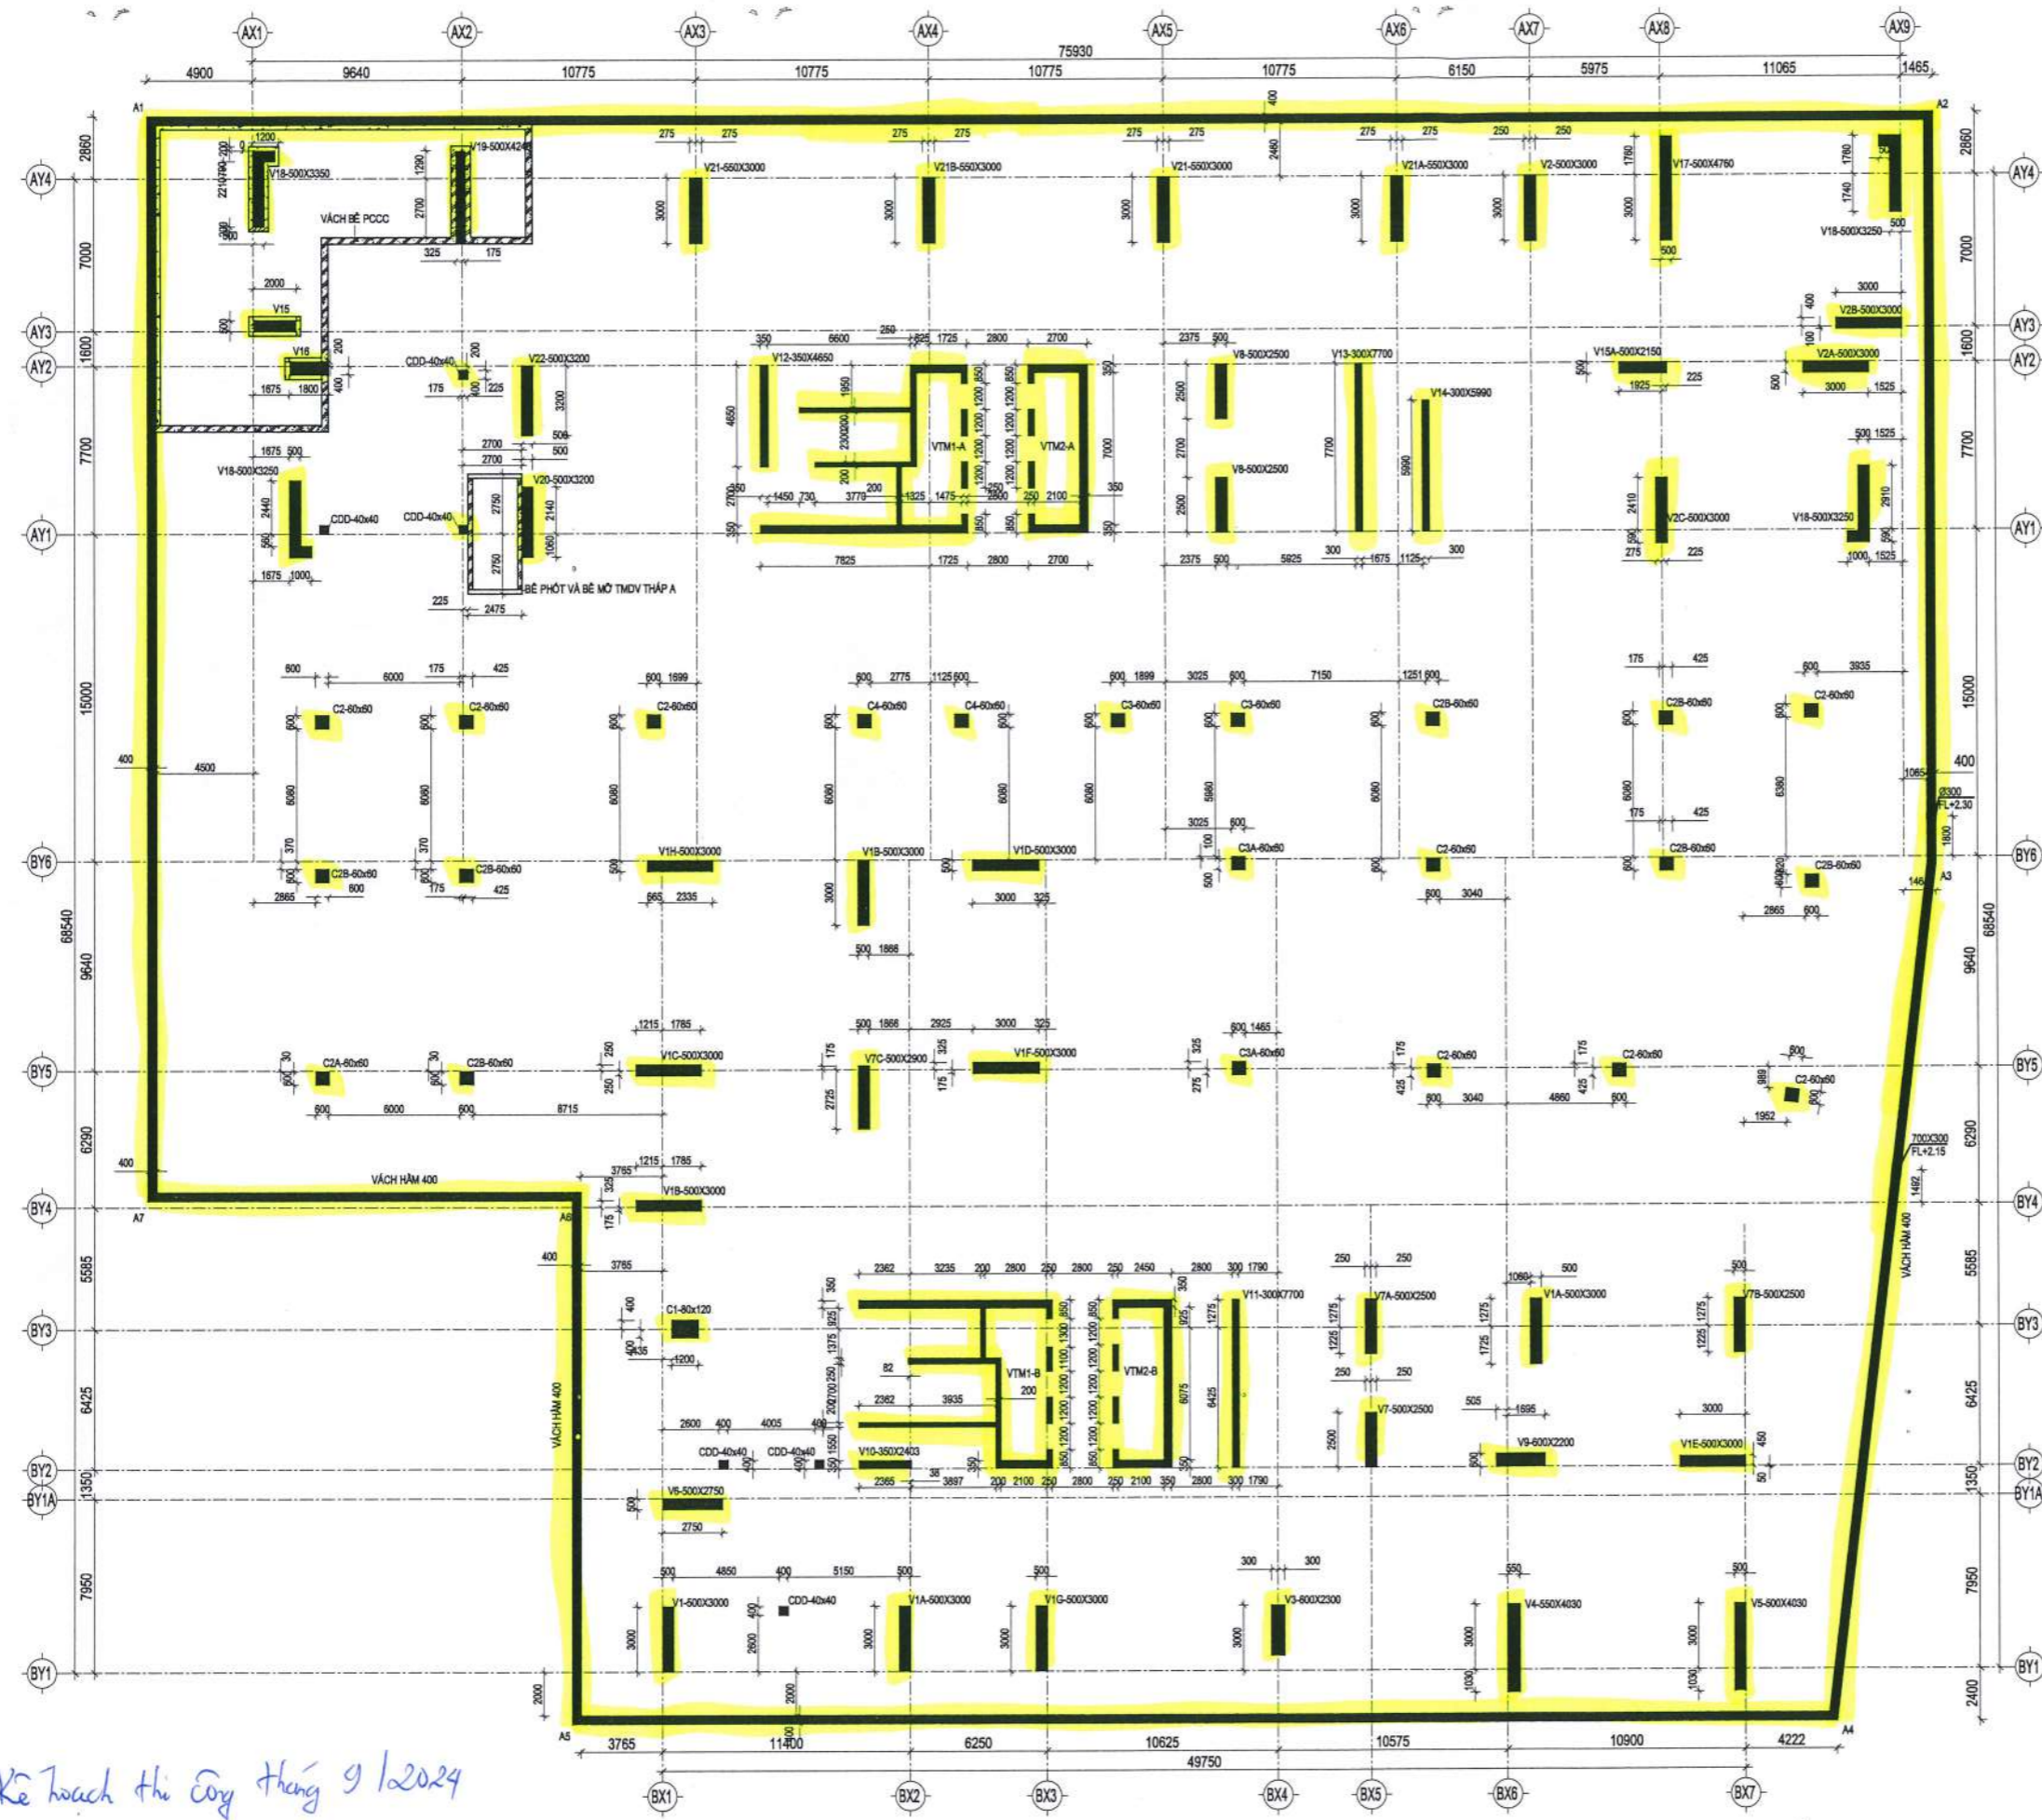

Kế hoạch thi công tháng 9/2024

MẶT BẰNG KẾ HOẠCH THI CÔNG CỘT VÁCH HẦM B1 (COS -3.600) THÁNG 9/2024

BẢN VẼ SHOPDRAWING

DỰ ÁN:

**CHUNG CƯ KHU VƯỜN TRÊN MÂY
A & T (A & T SKY GARDEN)**

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG : SỐ 54C, KHU PHỐ HÒA LONG PHƯƠNG LÁI
THIỆU, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ ĐẦU TƯ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN ĐÔ THỊ A & T BÌNH DƯƠNG**



ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG : SỐ 54C, KHU PHỐ HÒA LONG PHƯƠNG LÁI
THIỆU, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

TƯ VẤN GIÁM SÁT

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,
THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG- CONINCO**



ĐỊA CHỈ: SỐ 4 PHỐ TÔN THẤT TÙNG, PHƯỜNG TRUNG TỰ, QUẬN ĐÔNG
ĐÀ, TP HÀ NỘI

GIÁM SÁT TRƯỞNG:

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

NGƯỜI KIỂM TRA

NGUYỄN TRƯƠNG THẮNG

NHÀ THẦU THI CÔNG :

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC



ĐC: LK18-24, GALAXY 8, KHU NHÀ Ở NGÃ HÀ VAN PHÚC, 89 TÔ HỮU
VĂN PHÚC - HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI

TEL: 0243 9430 888

CHỈ HUY TRƯỞNG:

NGUYỄN QUANG LÂM

NGƯỜI THỰC HIỆN

NGUYỄN TRẦN THUẬN
PHÁT

GÓI THẦU:

TỔNG THẦU THI CÔNG

HẠNG MỤC:

BIỆN PHÁP THI CÔNG

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG BỐ TRÍ MẠCH NGỪNG SÀN HẦM B2

SỐ HIỆU BV:

A&T/CDC/KC/BVBP/TC/MN-02


NGÀY LẬP BV:

27/07/2024

BV THAM CHIẾU

CHỈNH SỬA:

REV03

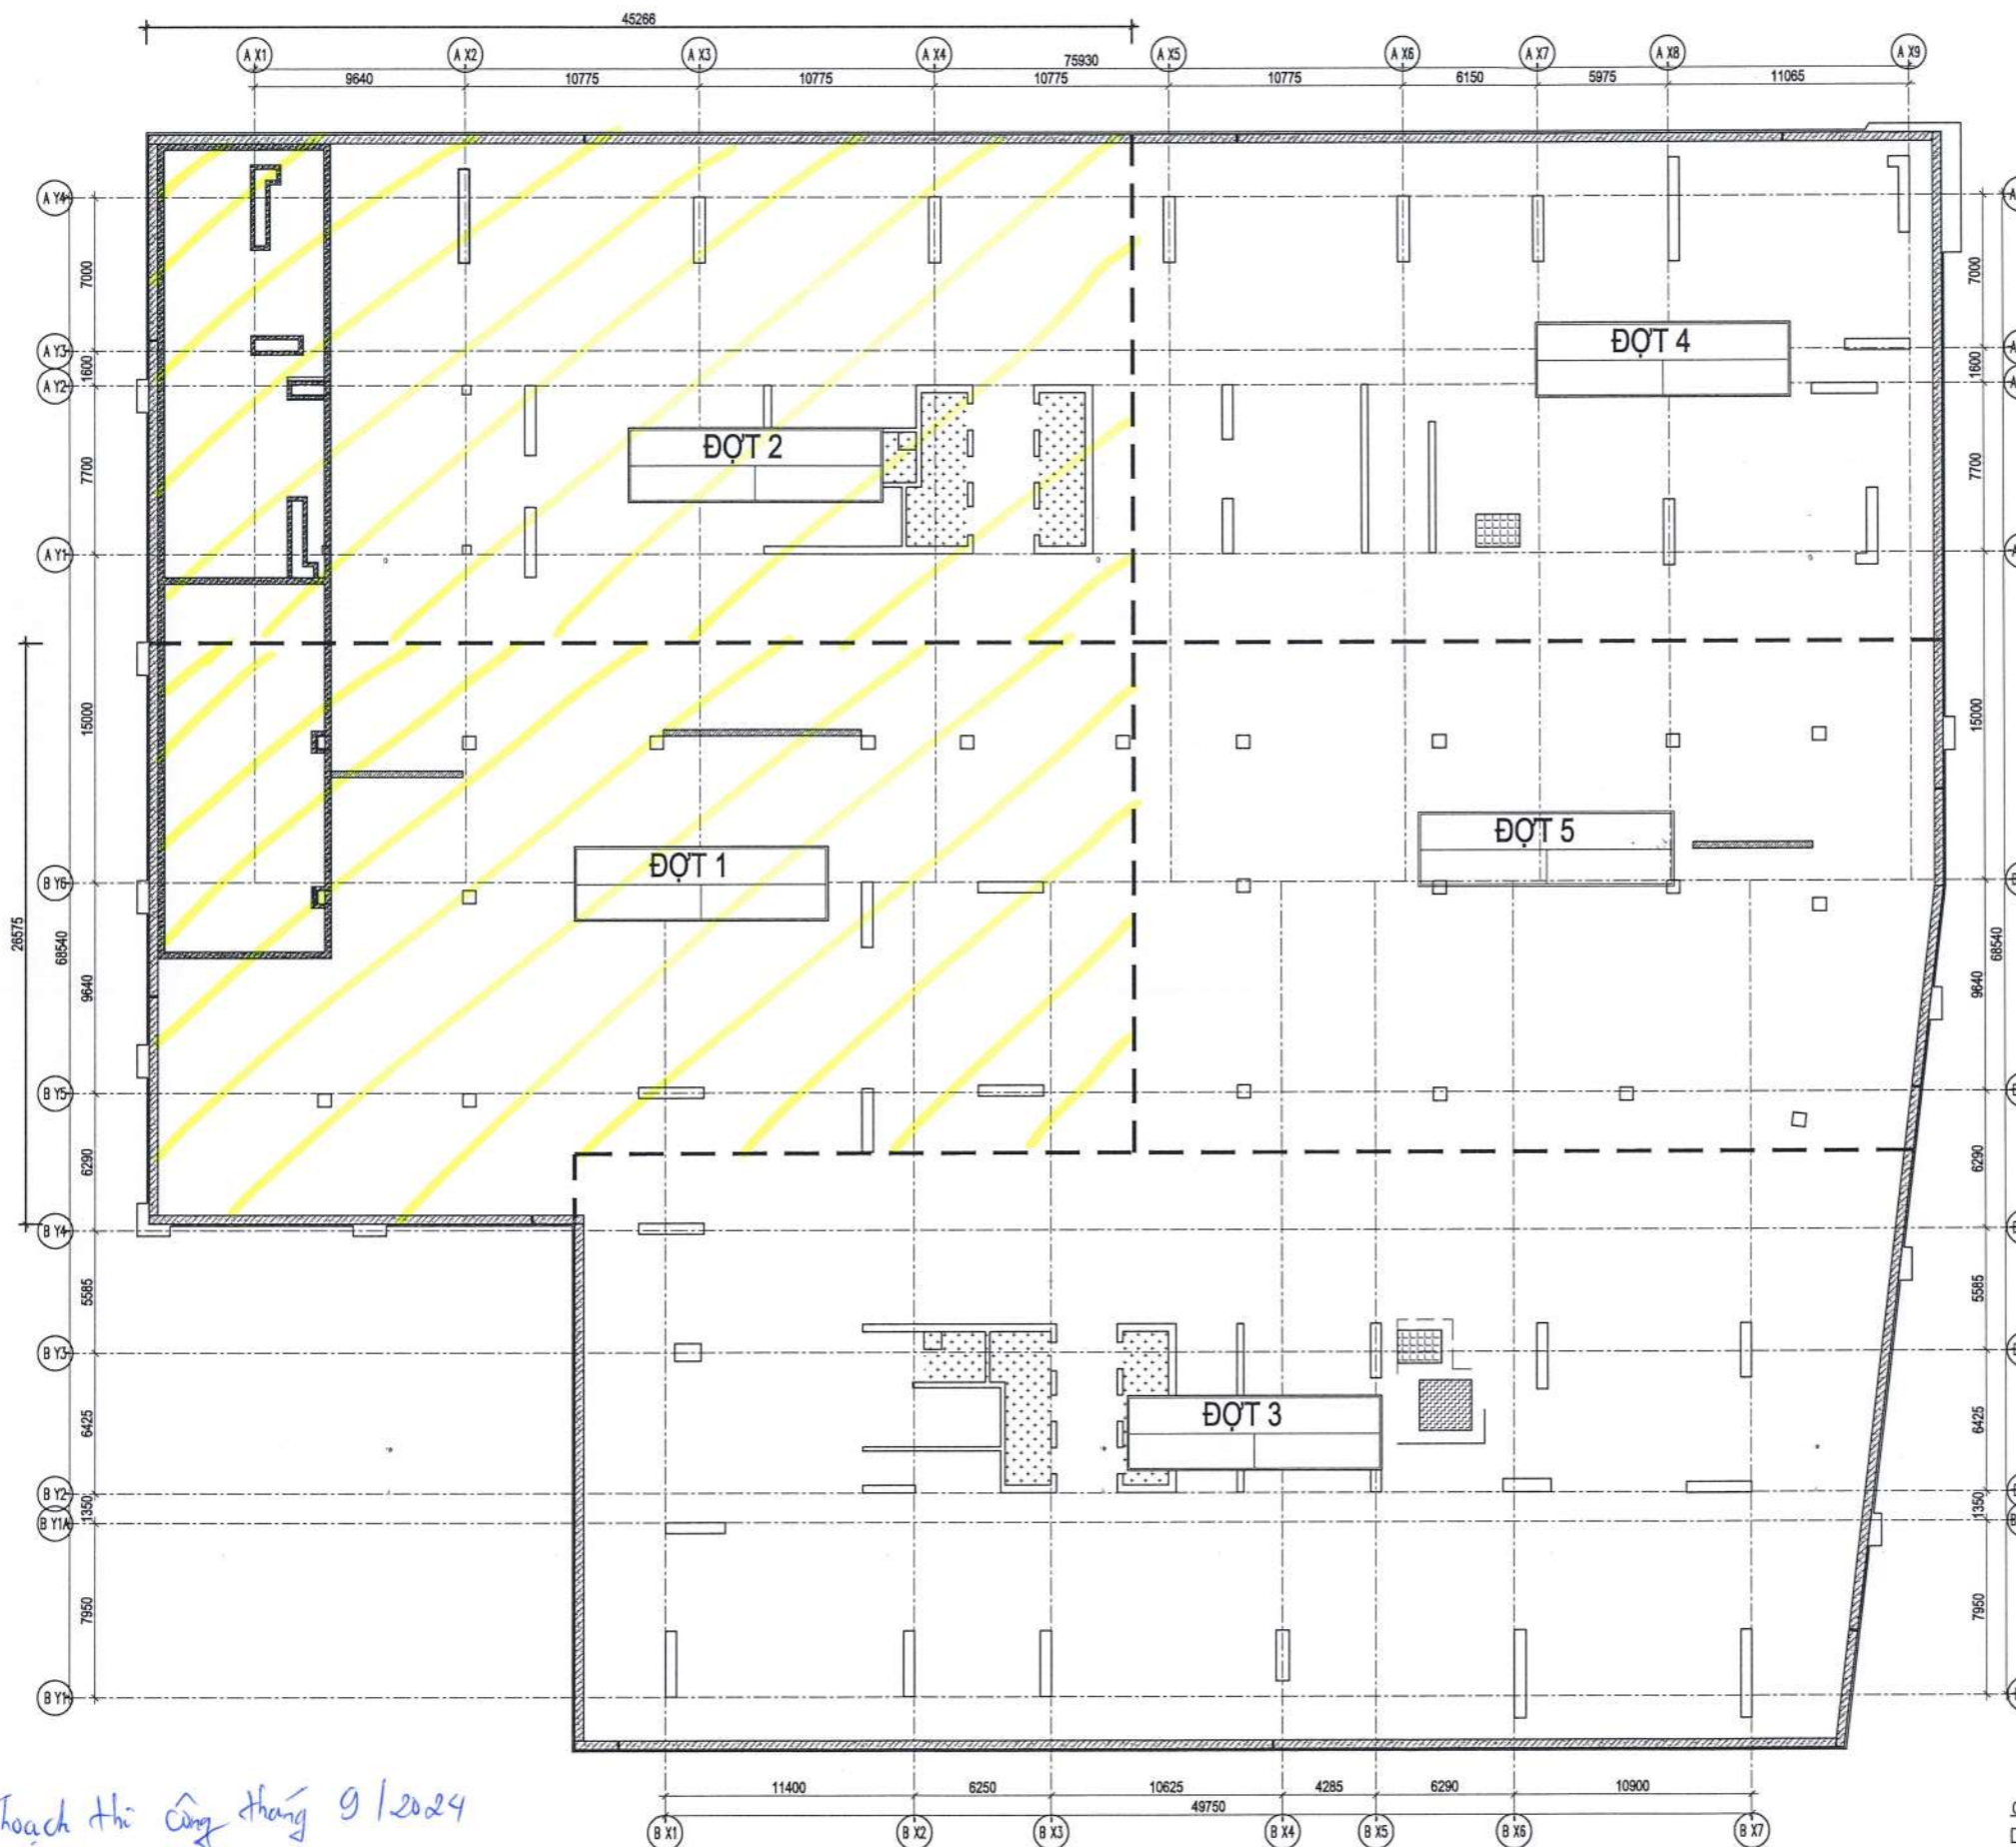

Kế hoạch thi công tháng 9/2024

MẶT BẰNG KẾ HOẠCH THI CÔNG SÀN COS 0.00 THÁNG 9/2024

- GHI CHÚ:**
- SÀN DẦY 500 (CỐT -6.60)
 - SÀN HỒ PÍT DẦY 1500 HẠ CỐT 3000 (CỐT -8.60)
 - SÀN HỒ BƠM DẦY 500 HẠ CỐT 2050 (CỐT -8.65)
 - RẠNH NƯỚC
 - MẠCH BẾ NƯỚC SINH HOẠT
 - HỒ PÍT THANG MÁY DẦY 500 HẠ CỐT 1500 (CỐT -8.10)
 - LỖ MỎ, LỖ KT
 - SÀN GA THU NƯỚC DẦY 500 HẠ CỐT THEO
